

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПЕРВОГО ЭТАПА

Ид.		СДР	Назва задачі	Протяжність	Початок
1		<u>1</u>	РЕМОНТ КВАРТИРИ ЖК МАЛАНЮКА 101	121 день	Пн 17.10.22
		<u>1.1</u>	ПІДПИС ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ	0 днів	Пн 17.10.22
		<u>1.2</u>	ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП	2 днів	Пн 17.10.22
4		<u>1.2.1</u>	Підготовчі роботи	2 днів	Пн 17.10.22
		<u>1.3</u>	ПЕРШИЙ ЕТАП	45 днів	Ср 19.10.22
8		<u>1.3.1</u>	Загально-будівельні роботи	24 днів	Ср 19.10.22
9		1.3.1.1	Комплектування матеріалами	2 днів	Ср 19.10.22
13		1.3.1.2	Виконання робіт	22 днів	Пт 21.10.22
21		<u>1.3.2</u>	Електромонтажні роботи Перший етап	21 днів	Вт 22.11.22
22		1.3.2.1	Комплектування матеріалами	1 днів	Вт 22.11.22
24		1.3.2.2	Виконання робіт	20 днів	Ср 23.11.22
28		<u>1.3.3</u>	Сантехнічні роботи Перший етап	5 днів	Вт 22.11.22
29		1.3.3.1	Комплектування матеріалами	1 днів	Вт 22.11.22
31		1.3.3.2	Виконання робіт	4 днів	Ср 23.11.22
		<u>1.4</u>	ДРУГИЙ ЕТАП	50 днів	Ср 21.12.22

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПЕРВОГО ЭТАПА

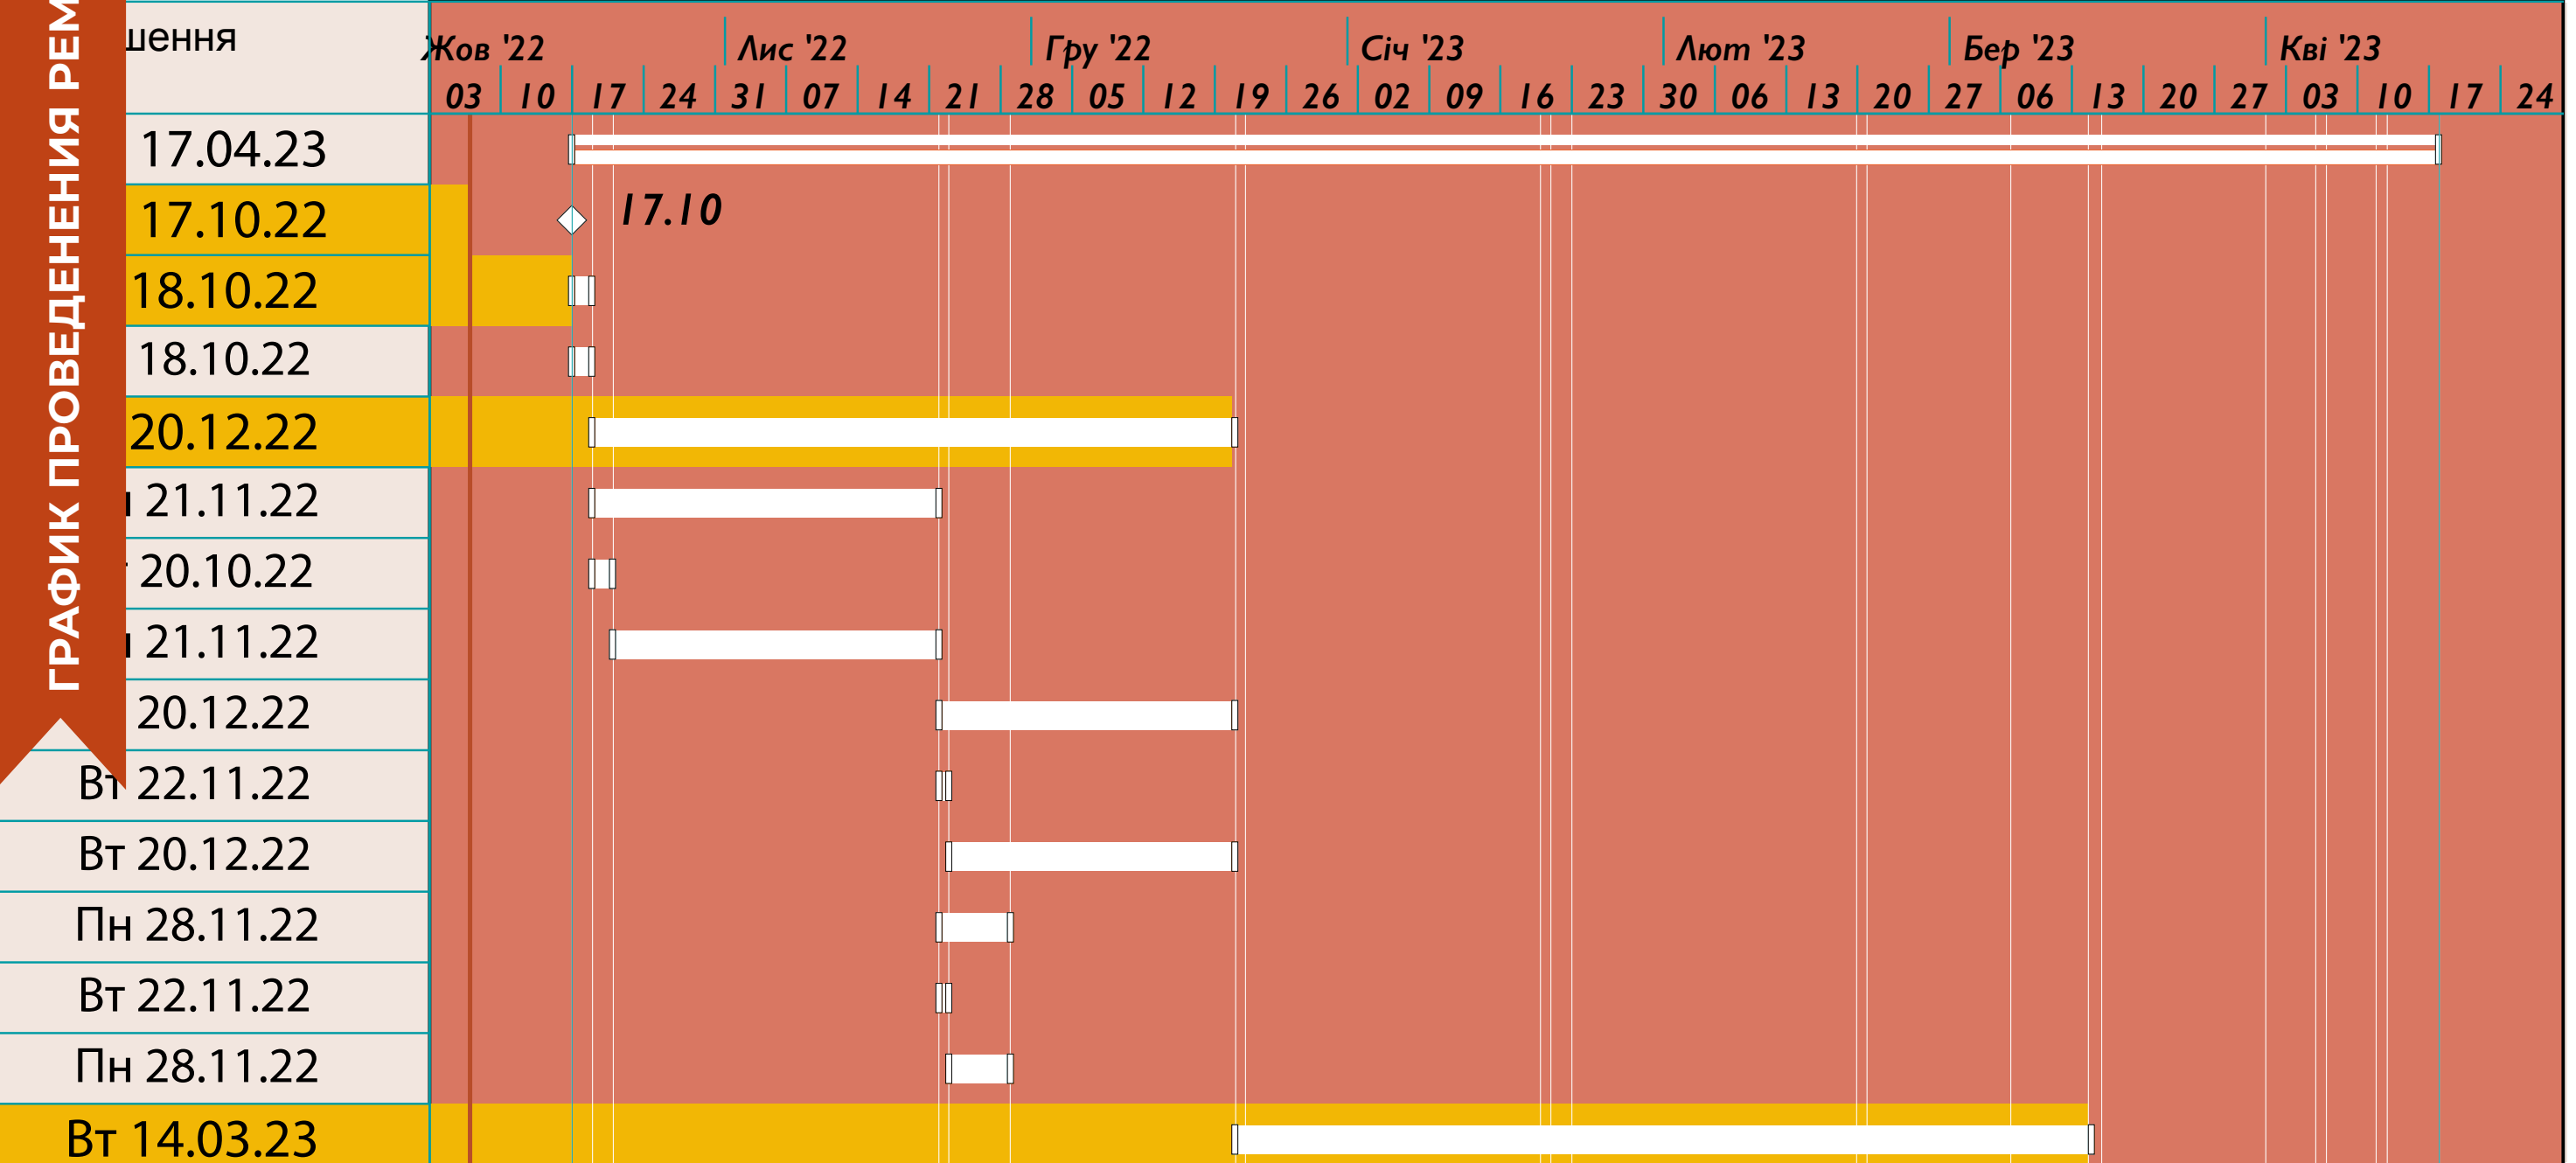


ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ВТОРОГО ЭТАПА

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ВТОРОГО ЭТАПА

Ид.		СДР	Назва задачі	Протяжність	Початок	Завершення	Гант-діаграма																													
							Жов '22				Лис '22				Гру '22				Січ '23				Лют '23				Бер '23				Кві '23					
							03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17	24
1		<u>1</u>	РЕМОНТ КВАРТИРИ ЖК МАЛАНЮКА 101	121 день	Пн 17.10.22	Пн 17.04.23																														
		<u>1.4</u>	ДРУГИЙ ЕТАП	50 днів	Ср 21.12.22	Вт 14.03.23																														
35		<u>1.4.1</u>	Гіпсокартонні роботи	12 днів	Ср 21.12.22	Чт 19.01.23																														
36		1.4.1.1	Комплектування матеріалами	1 днів	Ср 21.12.22	Ср 21.12.22																														
38		1.4.1.2	Виконання робіт	11 днів	Чт 22.12.22	Чт 19.01.23																														
41		<u>1.4.2</u>	Малярні роботи Перший етап	32 днів	Пт 20.01.23	Пн 06.03.23																														
42		1.4.2.1	Комплектування матеріалами	1 днів	Пт 20.01.23	Пт 20.01.23																														
44		1.4.2.2	Виконання робіт	31 днів	Пн 23.01.23	Пн 06.03.23																														
47		<u>1.4.3</u>	Плиткові роботи	17 днів	Пн 20.02.23	Вт 14.03.23																														
48		1.4.3.1	Комплектування матеріалами	1 днів	Пн 20.02.23	Пн 20.02.23																														
50		1.4.3.2	Виконання робіт	16 днів	Вт 21.02.23	Вт 14.03.23																														
		<u>1.5</u>	ТРЕТІЙ ЕТАП	24 днів	Ср 15.03.23	Пн 17.04.23																														

Ид.		СДР	Назва задачі	Протяжність	Початок	Завершення	Гант-діаграма																													
							Жов '22				Лис '22				Гру '22				Січ '23				Лют '23				Бер '23				Кві '23					
							03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	06	13	20	27	03	10	17	24
1		<u>1</u>	РЕМОНТ КВАРТИРИ ЖК МАЛАНЮКА 101	121 день	Пн 17.10.22	Пн 17.04.23																														
		<u>1.5</u>	ТРЕТІЙ ЕТАП	24 днів	Ср 15.03.23	Пн 17.04.23																														
55		<u>1.5.1</u>	Малярні роботи Другий етап	16 днів	Ср 15.03.23	Ср 05.04.23																														
56		1.5.1.1	Комплектування матеріалами	1 днів	Ср 15.03.23	Ср 15.03.23																														
58		1.5.1.2	Виконання робіт	15 днів	Чт 16.03.23	Ср 05.04.23																														
61		<u>1.5.2</u>	Електромонтажні роботи Другий етап	8 днів	Чт 06.04.23	Пн 17.04.23																														
62		1.5.2.1	Комплектування матеріалами	1 днів	Чт 06.04.23	Чт 06.04.23																														
64		1.5.2.2	Виконання робіт	7 днів	Пт 07.04.23	Пн 17.04.23																														
67		<u>1.5.3</u>	Сантехнічні роботи Другий етап	4 днів	Чт 06.04.23	Вт 11.04.23																														
68		1.5.3.1	Комплектування матеріалами	1 днів	Чт 06.04.23	Чт 06.04.23																														
70		1.5.3.2	Виконання робіт	3 днів	Пт 07.04.23	Вт 11.04.23																														
73		<u>1.5.4</u>	Влаштування підлогового покриття	4 днів	Ср 12.04.23	Пн 17.04.23																														
74		1.5.4.1	Комплектування матеріалами	1 днів	Ср 12.04.23	Ср 12.04.23																														
76		1.5.4.2	Виконання робіт	3 днів	Чт 13.04.23	Пн 17.04.23																														
